


桶川駅東口整備事業 の進捗状況について



1 「駅東口駅前広場」整備事業

(1) 駅東口駅前広場（駅前ロータリー）の詳細設計について

令和2年度から令和3年度に実施させていただきました駅東口駅前広場（駅前ロータリー）の詳細設計の成果について御報告いたします。

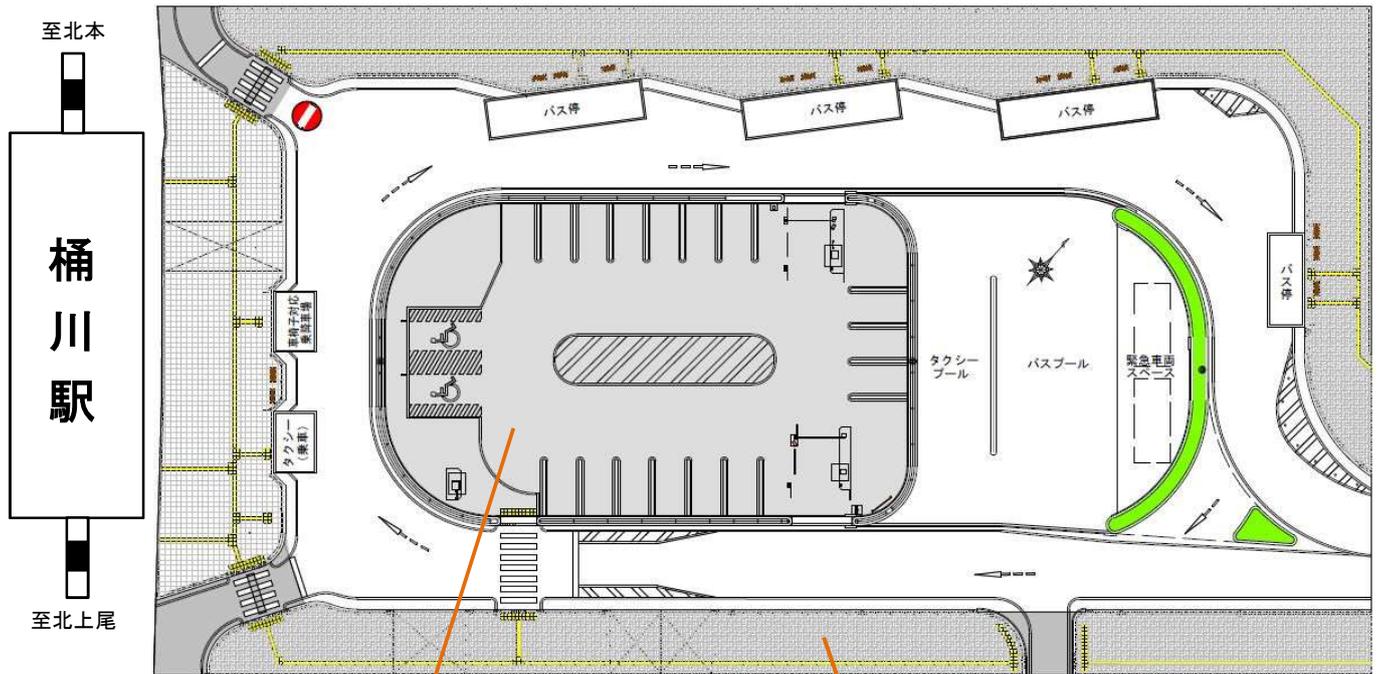

駅前広場平面図

※この図面は今後変更の可能性があります。

主な特徴

① 駅東口利用者のための送迎場の設置

送迎を安全かつ円滑に行っていただけるよう、駅東口駅前広場中央の島地部分を一般車両の送迎用駐車スペースとして確保します。

② 歩道の幅員と視界の十分な確保

構造物等の設置を必要最小限にすることで、歩道の幅員と広場内の視界を確保することができます。車いすや点字ブロックを利用される方など全ての方が余裕をもって安全に通行できるよう、整備を進めます。

今後の取組

公安委員会協議：駅東口駅前広場（駅前ロータリー）のレイアウト（車線や横断歩道の設置箇所等）については、警察協議を経て設計されましたが、最終的に公安委員会と協議を行うため、現在の設計内容が一部変更となる可能性があります。


シェルター・街路灯：現在、シェルター（歩行者用屋根）の設計及び街路灯の調整を進めています。デザインや配置等の詳細については、地元商店会の御意見等を伺いながら決めてまいります。

無電柱化詳細設計：現在、無電柱化のための設計を実施しています。駅東口駅前広場（駅前ロータリー）を無電柱化にすることで、安全で快適な歩行空間の確保や災害の防止、景観の向上等が図られます。

(2) 駅前広場整備事業の進捗状況について

「駅東口駅前広場」の整備事業につきましては、関係する権利者皆様の御理解・御協力により、令和4年9月末時点で**事業用地の約88%**を譲渡していただいております。

現在、当該用地については、駅東口送迎場として御利用していただいておりますが、拡張工事を行ったことにより、本年度から14台分の駐車スペースを確保することができました。送迎場については、広報・ホームページ等で周知させていただいております。併せて、駅東口における送迎については、駅東口送迎場の他、べにばなGO駐車場を御利用いただき、道路上の送迎は御遠慮いただくよう、啓発させていただいております。

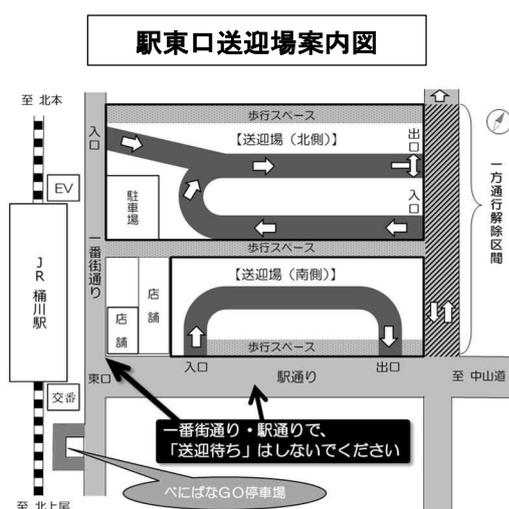

<事業の進捗状況> 用地買収対象面積：3,731.58㎡

年度	買収済面積(㎡)	各年度進捗率(約○%)	各年度末進捗率(約○%)	備考
平成26年度	1,106.46	30	30	
平成27年度	1,129.05	30	60	
平成28年度	127.32	3	63	
平成29年度	112.31	3	66	
平成30年度	-	-	-	
令和元年度	445.17	12	78	
令和2年度	63.63	2	80	
令和3年度	145.26	4	84	
令和4年度	146.13	4	88	9月末時点
合計	3,275.33			

2 駅東口通り線・仲仙道線整備事業(埼玉県事業)

「駅東口駅前広場」から中山道までの「駅東口通り線」と「仲仙道線」の整備事業につきましては、関係する権利者皆様の御理解・御協力により、令和4年9月末時点で**事業用地の約72%**を譲渡していただいております。

引き続き、早期整備を目指し埼玉県と協力しながら用地取得を進めてまいります。

<事業の進捗状況> 用地買収対象面積：2,366.48㎡

年 度	買収済面積(㎡)	各年度 進捗率(約○%)	各年度末 進捗率(約○%)	備 考
平成28年度	66.34	3	3	
平成29年度	207.89	9	12	
平成30年度	291.15	12	24	
令和元年度	695.31	29	53	
令和2年度	333.99	14	67	
令和3年度	32.69	1	69	
令和4年度	78.11	3	72	9月末時点
合 計	1,705.48			

3 市道11-1号線整備事業

「駅東口通り線」と「仲仙道線」交差点部の「市道11-1号線(延長80m区間)」の整備事業につきましては、関係する権利者皆様の御理解・御協力により、令和3年度で**事業用地の100%**を譲渡していただくことができました。

<事業の進捗状況> 用地買収対象面積：1,072.94㎡

年 度	買収済面積(㎡)	各年度 進捗率(約○%)	各年度末 進捗率(約○%)	備 考
令和2年度	396.89	37	37	
令和3年度	676.05	63	100	
合 計	1,072.94			

4 南小跡地周辺道路整備事業

南小跡地の利活用を図るため、整備事業の基礎となる周辺のインフラ整備について、整備可能な場所から順次施工しているところです。南小跡地西側道路については、今年度、水道管の敷設工事を実施しており、下水道管及びガス管の敷設工事を順次実施する予定となっております。また、南小跡地東側道路については、今年度、水道管の敷設工事を実施する予定となっております。

今後も引き続き、関係権利者様の御理解、御協力をいただきながら、事業進捗に取り組んでまいります。よろしくお願いたします。



桶川市マスコットキャラクター オケちゃん

【桶川市役所 駅東口整備推進課】

所在地：桶川市泉一丁目3番28号

電話番号：048-783-2526

FAX 番号：048-786-5043

E-Mail：ekitouseibi@city.okegawa.lg.jp

業務時間：午前8時30分から午後5時15分まで

※土・日・祝祭日及び年末年始を除く



令和4年11月発行
